国都证券开户系统升级方案

目　录

项目概述

一、 同花顺开户系统建设

2.1 项目启动与需求 · 2.2 设计与开发 · 2.3 测试与修复 · 2.4 上线与总结

网厅H5功能对接（同步并行）

二、 现有系统改造升级

1.1 手机号同花顺一键注册 · 1.2 营业部选项隐藏与固定展示 · 1.3 信息补充页面折叠层优化

三、 同花顺开户系统上线后运营

3.1 数据跟踪与专项活动运营 · 3.2 增值提佣开发与上线

附录：项目整体进度甘特图（三轨合并）

项目沟通机制

概 项目概述

本项目旨在完成国都证券与同花顺平台的开户系统全面对接与升级，涵盖现有系统改造、开户系统建设及上线后运营三个阶段。项目由创新金融部牵头，协同信息技术中心、财富管理总部、运营管理部及杭州环城北路营业部共同推进。

项目背景与目标

- 当前同花顺渠道已成为证券开户的重要流量入口，为提升客户开户体验、提高转化效率，需对现有开户流程进行系统性优化升级。
- 完成同花顺开户系统的测试、部署与生产上线，实现全流程闭环。
- 上线后持续跟踪运营数据，确保转化率 ≥ 30%、成功率 ≥ 70%，年内实现流量 3000–5000 户。

涉及部门与职责

创新金融部： 项目总体协调、上线后运营统筹、专项活动对接

信息技术中心： 技术评估、系统开发、测试与生产环境运维

财富管理总部： 业务流程验证、视频见证测试、业务规则确认；网厅H5功能立项与对接推进

运营管理部： 开户全流程合规审查、风测选项及协议核验

杭州环城北路营业部： 单/双向视频验证测试执行

一 同花顺开户系统建设

按照产品研发全生命周期划分为前置商务阶段和四个子阶段。**整体周期9周**，由同花顺开发方与国都证券各业务部门协同推进。
网厅H5功能对接与开户系统建设**同步并行推进**，由财富管理总部牵头立项，信息技术中心与同花顺开发团队共同实现。

责任部门： 同花顺（石文杰） 信息技术中心（熊伟平）

前置：单一来源采购与商务谈判（第1周） 共 2 个里程碑

里程碑 1：单一来源采购审批 7月20日–7月26日 已完成

- 发起单一来源采购申请
- 采购审批流程流转
- 采购合同法务审核

责任部门： 信息技术中心（项目经理：熊伟平）
输出物： 《单一来源采购审批单》《采购合同》

里程碑 2：商务谈判与签约 7月20日–7月26日 已完成

- 同花顺商务对接人石文杰与国都证券双方商务条款洽谈
- 明确接口授权范围、数据安全责任划分
- 技术合作框架协议签署
- 确认端内流量激励机制与系统长期运营维护条款

✓ 商务谈判已完成（8月4日）

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（项目经理：熊伟平）
输出物： 《技术合作框架协议》《商务洽谈纪要》

2.1 项目启动与需求阶段（第一周 7月20日–7月26日） 共 4 个里程碑

里程碑 3：项目动员会 7月20日–7月26日 已完成

- 项目目标宣贯
- 实施计划确认
- 双方职责确认

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（项目经理：熊伟平）
输出物： 《项目计划排期》《会议纪要》

里程碑 4：需求沟通 7月20日–7月26日 已完成

- 收集业务规则
- 补充需求沟通

✓ **已确认：单双向视频可否使用语音播报；深圳、上海满三户的开户转户问题（7月20日–7月26日）**

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（项目经理：熊伟平）
输出物： 《补充需求清单》《业务规则清单》

里程碑 5：UI / 交互确认 7月20日–7月26日 已完成

- 开户流程确认
- 页面原型确认
- 交互细节确认

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（项目经理：熊伟平）
输出物： 《UI确认稿》《原型确认稿》

里程碑 6：需求确认 7月20日–7月26日 已完成

- 确认一期上线范围
- 确认业务流程
- 确认硬件资源需求

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（项目经理：熊伟平）
输出物： 《需求文档确认稿》《硬件清单》

2.2 设计与开发阶段 共 4 个里程碑

里程碑 7：技术方案设计 7月20日–7月26日 已完成

- 方案设计
- 部署方案设计

责任部门： 同花顺（技术负责人）、信息技术中心（项目经理：熊伟平）
输出物： 《技术方案》《接口文档》

里程碑 8：环境准备 7月20日–7月26日 已完成

- 服务器准备（应用服务器 ×3、音视频服务器 ×3、WEB服务器 ×2 等）
- 数据库准备（支持 OceanBase / TDSQL / TiDB）
- 信创中间件安装（麒麟 V10 / openEuler）

责任部门： 信息技术中心
输出物： 《环境部署清单》

里程碑 9：测试环境部署 7月27日–8月9日 已完成

- 测试环境发布
- 测试数据准备

✓ 硬件竞争性谈判已结束，厂商备货中（周期约2个月）
责任部门：信息技术中心
输出物：《测试环境部署报告》

里程碑 10：功能开发 8月7日–9月14日 已完成

- ✓ 补充需求开发
- ✓ 开户流程优化开发
- ✓ 后台配置开发
- ✓ 接口开发
- ✓ 短信中心开发已完成
- ✓ 呼叫中心开发已完成
- ✓ 信创中间件适配已完成
- ✓ 开户系统已部署至测试环境，网络已解决，外网可正常访问
- ✓ 协议和三方存管协议配置已完成

责任部门：同花顺（开发负责人）、信息技术中心（项目经理：熊伟平）
输出物：开户系统 V1.4 版本
测试环境开发已全部完成，项目进入测试验收阶段。

2.3 测试与修复阶段 共 8 个里程碑

测试进展更新（10月16日）

✓ 测试环境开发已全部完成，柜台、外呼均已调通；✓ 四家营业部同时进行了双向视频和单向视频的测试，收集到部分问题，下周逐家解决；✓ 已为营业部开展两次培训（审核、断点挽回）；▸ 外呼系统正在调整派单机制（回访派单至营业部），同步开发兜底机制（客服中心承接外呼）。

里程碑 11：第三方系统联调 9月7日–10月16日 已完成

- **✓ 短信平台联调成功**
- **✓ 柜台联调已调通**
- **✓ 外呼中心联调已调通**
- **✓ 单向视频跑批测试完成（开户→审批→柜台跑批）**
- **✓ 四家营业部完成双向视频和单向视频测试，收集到部分问题，下周逐家解决**
- **✓ 公安核验联调完成**

责任部门：同花顺（技术负责人）、信息技术中心（熊伟平）
输出物：《联调报告》
本周进展：测试环境开发已全部完成，柜台、外呼均已调通；四家营业部同时完成双向视频和单向视频测试，收集到部分问题，下周逐家解决；已为营业部开展两次培训（审核、断点挽回）。
外呼系统正在调整派单机制（回访派单至营业部），同步开发兜底机制（客服中心承接外呼）。


新旧开户系统界面对比

老版本开户流程



新版开户系统



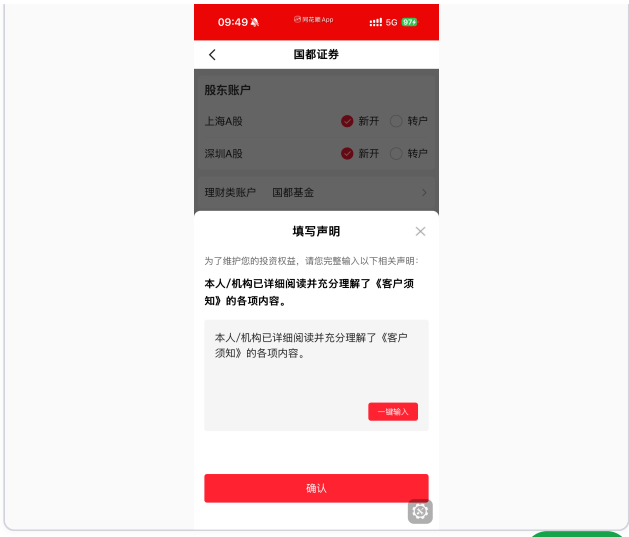

里程碑 12：同花顺一轮测试 9月20日–9月21日 已完成

- 功能测试
- 流程测试
- 缺陷提交

责任部门： 同花顺（测试负责人）、信息技术中心（熊伟平）、创新金融部（周欣）、杭州营业部
输出物： 《测试报告 V1》

里程碑 13：缺陷修复（第一轮） 9月21日–9月25日 已完成

- BUG修复
- 版本发布

责任部门： 同花顺（开发负责人）
输出物： 开户系统 V1.4.1

里程碑 14：提交国都测试 9月26日 已完成

- 需求符合性检查
- 流程验收
- 配置验收

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（熊伟平）
输出物： 《提测报告》

里程碑 15：券商一轮测试 & 同花顺二轮测试 9月26日–9月28日 已完成

- 业务验证
- 回归测试

责任部门： 同花顺（测试负责人）、信息技术中心（熊伟平）
输出物： 《回归测试报告 V2》

里程碑 16：缺陷修复（第二轮） 9月25日–9月28日 已完成

- 高优先级问题修复

责任部门： 同花顺（开发负责人）
输出物： 开户系统 V1.4.2

里程碑 17：券商二轮测试（UAT） 9月29日–9月30日 已完成

- 用户验收测试

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（熊伟平）
输出物： 《UAT验收报告》

里程碑 18：上线评审会 9月30日 未开始

- 上线条件确认
- 回滚方案确认

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（熊伟平）
输出物： 《上线评审纪要》

⚠ 等待硬件采购 最新消息：11月10日前到货

- **✓ 竞争性谈判已结束**
- **厂商备货中，最新消息：硬件将于11月10日之前到货**
- **硬件到位后启动生产环境部署，11月10日后的一个周末完成生产环境测试，测试通过后即可上线**
- **等待期间继续推进与同花顺的补充协议，补充协议签订后方可启动专项活动**

2.4 上线与总结阶段 共 5 个里程碑

里程碑 19：生产环境部署 11月10日后 未开始

- 生产环境安装
- 参数配置
- 系统验证

责任部门： 信息技术中心
输出物： 《生产部署报告》
计划：硬件到货后（11月10日前）立即启动生产环境部署

里程碑 20：生产环境验收 11月10日后的周末 未开始

- 生产冒烟测试
- 业务验证

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（熊伟平）
输出物： 《生产验收报告》
计划：11月10日后的一个周末完成生产环境测试

里程碑 21：灰度上线 生产测试通过后 未开始

- 小流量AB测试验证
- 监控观察

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（熊伟平）
输出物： 《灰度运行报告》
计划：生产环境测试通过后启动

里程碑 22：正式上线 生产测试通过后 未开始

- 同花顺渠道全量开放

责任部门： 同花顺（石文杰）、信息技术中心（熊伟平）
输出物： 《上线总结报告》
生产环境测试没有问题之后即可上线（预计11月中旬）

里程碑 23：项目总结 上线后 未开始

- 项目复盘
- 运维交接
- 培训交接

责任部门： 信息技术中心（熊伟平）、同花顺（石文杰）
输出物： 《项目总结报告》《运维手册》

同步并行：网厅H5功能对接 与开户系统建设同步 与开户系统建设同步推进

- 以H5网厅形式嵌入同花顺APP，完成16个功能模块的对接上线
- 涵盖：资产查询、持仓查询、交易记录、密码修改、风险测评、身份证更新、个人信息修改、银行卡变更等

责任部门： 财富管理总部（牵头立项）、信息技术中心（技术实现）、同花顺开发团队
输出物： 立项申请书、功能清单、H5对接方案、验收报告
备注： 此项与开户系统建设同步进行，不占用关键路径

二 现有系统改造升级

本阶段目标是完成现有系统与同花顺渠道的适配改造，为后续开户系统对接奠定基础。 同花顺开户系统上线前

完成时间：8月25日

本周进展（现有开户系统优化）

✓ 新客开户回访问卷更新已走完流程；✓ 高风险地区异地开户补充问卷流程已走完；✓ 单向视频开户语音播报联系单流程已走完；‣ 本周根据单向视频回访进行更新，拟把单向视频回访方式改为电子问卷加电话回访的形式，大大减少回访时间和客户因挂断电话而回访失败；原有开户系统优化统一在财富管理总部立项内推进。

对接人： 张嘉妮（财富管理总部） 陈仕春（财富管理总部）

1.1 手机号同花顺一键注册

功能描述： 同花顺端内实现手机号一键注册，将客户手机号经同花顺加密后传送至国都证券，国都证券侧使用密钥解密，完成免验证码快速注册。

对接人： 财富管理总部（张嘉妮、陈仕春）


技术要点： 加密算法协商、密钥交换机制、解密接口开发、注册流程对接

排期： 由信息技术中心技术评估后给出排期

交付物： 同花顺端内客户开户手机号一键注册。

登录注册页面对比

老版本 • 手机号验证码注册



升级后 • 同花顺手机号一键登录



1.2 营业部选择隐藏与展示优化 无法实现

功能描述： 在同花顺渠道前端隐藏营业部主动选择选项，将该字段移至「信息补充」步骤中做仅展示处理，客户不可修改。

对接人： 财富管理总部（张嘉妮、陈仕春）

技术要点： 前端页面改造、字段映射、营业部默认赋值逻辑

排期： 由信息技术中心技术评估后给出排期

交付物： 去除原本营业部选择页面，固定营业部选项在信息补充中。

⚠ 反馈结果：无法实现

第 1 点需求与现有功能和中登公安接口要求冲突，无法实现，故不评估第一点需求售后工作量。原因如下：

1. 营业部节点后置后，在证件上传时无法使用对应中登公安查询功能（需使用营业部网点代码）；
2. 与原 24 年提的异地开户需求冲突（证件地址与营业部地址不一致时，提示异地开户并且签署异地开户协议）。

1.3 信息补充页折叠层设计

功能描述： 在信息补充步骤最下方新增折叠层，将「职务」「邮编」「工作单位」设计为选填项放入折叠层中，降低客户填写负担，提升转化率。

对接人： 财富管理总部（张嘉妮、陈仕春）


技术要点： 前端UI改造、折叠交互设计、字段校验逻辑调整（选填）

排期： 由信息技术中心技术评估后给出排期

交付物： 信息补充页面整体优化

营业部选择页面与信息补充页面对比

老版本 • 营业部网点选择页



老版本 • 信息补充资料填写页



升级后 • 信息补充页折叠层设计原型

新版本原型 • 选填信息折叠层 + 营业部信息固定展示

原型内容详见 newinfo.html（打印时需在浏览器打印对话框中勾选"背景图形"）

三 同花顺开户系统上线后运营

本阶段聚焦数据监控与运营增长，确保持续产出。

3.1 数据跟踪与运营优化

责任部门：创新金融部（主责）、信息技术中心（数据支持）、财富管理总部（业务配合）

核心指标

≥ 30%	≥ 70%	3000–5000
转化率（注册 → 提交开户）	成功率（提交 → 开户成功）	年内开户流量目标（户）

监控机制

- 搭建开户漏斗看板（日报/周报）
- 各环节流失率分析
- 异常波动预警与排查

专项活动：积极参与同花顺端内广告引流专项活动，争取更多流量入口

交付物： 数据日报模板、月度运营分析报告、活动复盘报告

3.2 增值提佣开发与上线

完成时间：8月15日　**工具引入中 • 流程推进中**

功能描述：完成同花顺渠道增值提佣功能的技术开发与业务上线，实现客户增值服务费用的计提与管理，提升渠道收入贡献。本项目与开户系统同步启动，计划 8 周内完成，8月15日前上线。

负责人： 陈仕春（财富管理总部）、井淼（财富管理总部）

负责团队：同花顺（许敖）开发团队、信息技术中心（王卫炎）、财富管理总部（陈仕春、井淼）

本周进展

增值提佣工具仍在引入过程中，流程尚未走完；信息技术中心熊伟平、创新金融部周欣已确认第一期上线工具，增值服务平台与周边系统的**接口对接及接口文档已全部结束**；**同花顺开发已启动**。

本周具体进展：**增值提佣的两种方案都已交流完毕**，**优品正在评估给建设方案和报价**；同花顺方面信息技术中心正在**对接接口文档的调用方式**，**签约界面正在根据原本的引入方法进行设计**，设计完成之后会给合规进行审阅；**工具引入流程进度慢于预期，需持续跟踪推进**。

商务洽谈

同花顺商务对接人许敖与国都证券双方就增值提佣服务的选品范围、计提费率标准及分成结算方式等商务条款进行洽谈确认，签署增值服务合作协议。

项目里程碑计划

里程碑 1：服务器准备

责任部门：信息技术中心（王卫炎）、同花顺（许敖）
输出物：服务器资源申请单、服务器环境确认单

里程碑 2：测试环境部署包准备

责任部门：同花顺（许敖）
输出物：部署包版本说明、部署手册

里程碑 3：测试环境系统部署调试

责任部门：信息技术中心（王卫炎）、同花顺（许敖）
输出物：测试环境部署确认单

里程碑 4：前后端功能对接开发

责任部门：同花顺（许敖）
输出物：接口文档、功能开发版本说明

里程碑 5：整体功能流程调试自测

责任部门： 同花顺（许敖）
输出物： 自测报告

里程碑 6：产品确认里程碑

- 产品经理功能验收
- UI/交互效果确认

责任部门： 创新金融部、同花顺（许敖）
输出物： 产品验收确认单

里程碑 7：系统测试里程碑

- 整体功能测试验证
- Bug 验证及整体回归测试

责任部门： 同花顺（测试负责人）
输出物： 系统测试报告、Bug追踪清单

里程碑 8：券商验证

- 国都侧业务验证
- 合规检查

责任部门： 创新金融部（周欣）、运营管理部
输出物： 券商验证报告

里程碑 9：生产环境部署

责任部门： 信息技术中心（王卫炎）
输出物： 生产上线部署单、运维交接文档

里程碑 10：生产环境验证

- 生产环境功能冒烟测试
- 生产数据核对

责任部门： 同花顺（许敖）、创新金融部（周欣）
输出物： 生产验证报告

附 项目整体进度甘特图（三轨合并）

同花顺开户系统建设（7/20-11月中旬）+ 现有系统改造升级（7/20-8/25，对接人：张嘉妮、陈仕春）+ 增值提佣开发与上线（6/20-8/15，负责人：陈仕春、井淼）

#	里程碑	责任方	6/20-7/3	7/4-7/17	7/18-7/31	8/1-8/14	8/15-8/28	8/29-9/11	9/12-9/25	9/26-10/8	10/9-11... 硬件等待	11/10后 生产测试...
	🚀 一、同花顺开户系统建设 ⏱ 7/20 – 11月中旬											
	🔧 前置：单一来源采购与商务谈判 ⏱ 7/20-8/4											
1	M1 单一来源采购审批 ✓已完成	信息技术中...			采购							
2	M2 商务谈判与签约 ✓已完成	同花顺				商务						
	▸ 2.1 项目启动与需求 ⏱ 7/20-7/26											
3	M3 项目动员会 ✓已完成	同花顺			启动							
4	M4 需求沟通 ✓已完成	同花顺			需求							
5	M5 UI/交互确认 ✓已完成	同花顺			UI							
6	M6 需求确认 ✓已完成	同花顺			确认							
	▸ 2.2 设计与开发 ⏱ 7/20-9/7											
7	M7 技术方案设计 ✓已完成	同花顺			设计							
8	M8 环境准备 ✓已完成	信息技术中...			环境							
9	M9 测试环境部署 ✓已完成	信息技术中...			部署	部署						
10	M10 功能开发 ✓已完成	同花顺				开发	开发	开发				
	▸ 2.3 测试与修复 ⏱ 9/7-9/30											
11	M11 第三方系统联调 ✓已完成	同花顺						联调	联调	联调		
12	M12 同花顺一轮测试 ✓已完成	同花顺							测试			
13	M13 缺陷修复（第一轮） ✓已...	同花顺							修复			
14	M14 提交国都测试 ✓已完成	同花顺							提测			
15	M15 券商一轮 & 同花顺二轮 ✓...	创新金融部							验证			
16	M16 缺陷修复（第二轮）+ UAT ...	同花顺							UAT	UAT		
17	M17 上线评审会	项目经理								评审		
	▸ 2.4 上线与总结 ⏱ 11/10后 生产测试→上线											
18	M18 生产环境部署	信息技术中...										部署
19	M19 生产环境验收	同花顺										验收
20	M20 灰度上线	项目经理										灰度
21	M21 正式上线	项目经理										上线
22	M22 项目总结	信息技术中...										总结
	🔧 二、现有开户系统改造升级 ⏱ 7/20 – 8/25 ｜ 对接人：张嘉妮、陈仕春											
1	1.1 手机号同花顺一键注册	张嘉妮、陈...			开发	开发	完成					
2	1.2 营业部选择隐藏与展示优化	张嘉妮、陈...			开发	开发	完成					
3	1.3 信息补充页折叠层设计	张嘉妮、陈...			开发	开发	完成					

#	里程碑	责任方	6/20-7/3	7/4-7/17	7/18-7/31	8/1-8/14	8/15-8/28	8/29-9/11	9/12-9/25	9/26-10/8	10/9-11… 硬件等待	11/10后 生产测试…
	三、增值提佣开发与上线	6/20 – 8/15 | 负责人：陈仕春、井淼					状态：工具引入中 · 流程推进中					
1	M1 服务器准备	信息技术中…	准备									
2	M2 测试环境部署包准备	同花顺	包准备									
3	M3 测试环境部署调试	信息技术中…	调试	调试								
4	M4 前后端功能对接开发	同花顺		开发	开发							
5	M5 整体功能调试自测	同花顺			自测							
6	M6 产品确认	创新金融部			确认							
7	M7 系统测试	同花顺				测试						
8	M8 券商验证	创新金融部				验证						
9	M9 生产环境部署	信息技术中…				部署						
10	M10 生产环境验证	同花顺				验证						

说明：三条项目轨道按实际日期统一对齐到同一时间轴。轨道二（现有系统改造）于 8/25 前完成；轨道三（增值提佣）于 8/15 前完成；轨道一（同花顺开户系统）因硬件采购推迟，按 11 月中旬上线目标推进（硬件 11/10 前到货，生产环境周末测试通过后上线）。

流 项目进度与开户流量三种情景对比

横向时间轴对比三种情景下的周开户量：**情况一**（不上系统+不优化）仅**3户/周**；**情况二**（不上系统+优化流程关键点）**20户/周**；**情况三**（上线系统+专项活动）爆发至**300户/周**。差距高达**15倍→100倍**！



通 项目沟通机制

为确保项目顺利推进，建立以下沟通机制：

项目周会

频率：每周一次

参与人：三方部门接口人

内容：进度同步、问题升级、资源协调

技术评审会

频率：按需召开

参与人：IT + 同花顺技术

内容：技术方案评审、接口对齐

上线评审会

频率：上线前

参与人：全体相关方

内容：上线条件确认、风险评估

📊

月度运营复盘

频率：每月一次

参与人：创新金融部 + 财富管理总部

内容：数据复盘、优化策略
